

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0


Москва

2025

Содержание

1.	Цели и задачи системы.....	3
2.	Ключевые функции ИСУП X-Lance 2.0.....	4
3.	Структура данных системы	25
4.	Настройка системы	25
5.	Поставка системы.....	26

1. Цели и задачи системы

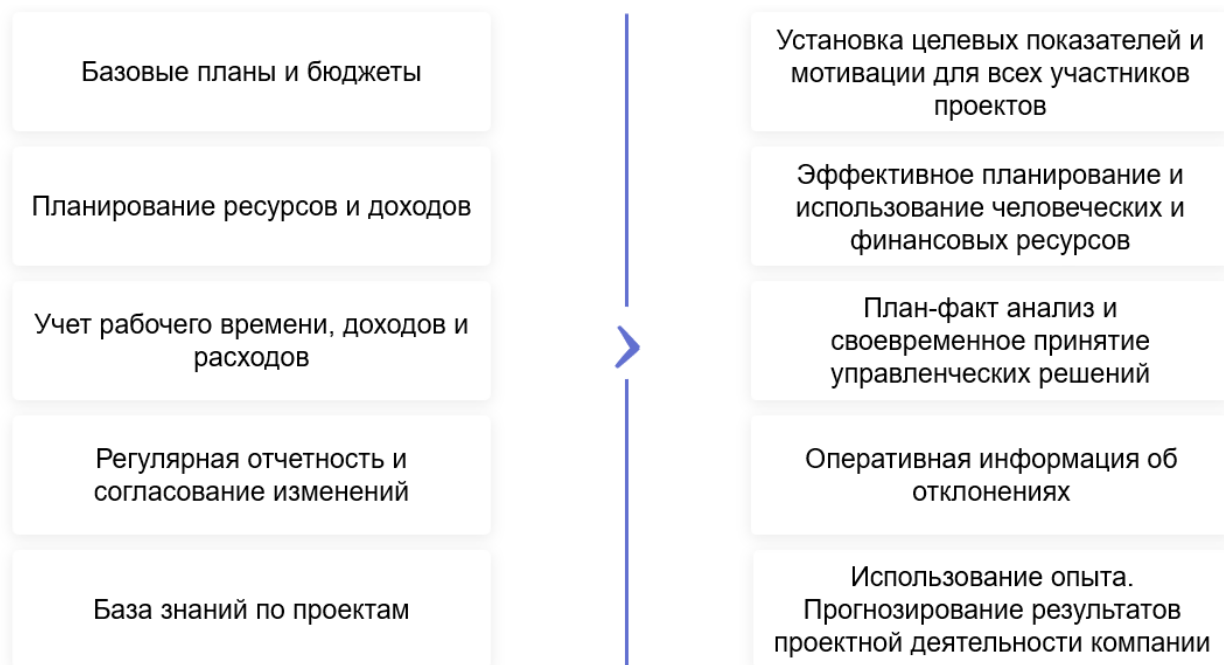

Основная концепция системы – автоматизация всех процессов проектно-ориентированной организации, начиная с процесса инициализации проекта и заканчивая закрытием проектов:

Инициализация	Планирование	Исполнение	Контроль	Закрытие
 - Справочник проектов и ресурсов - Реестр сделок и договоров - Базовые планы и бюджеты	 - План работ - Планирование ресурсов - Планирование и согласование расходов и доходов - Прогнозирование поступлений	 - Таймшиты - Таск-трекинг - Учет расходов и доходов - Изменение и согласование платежного календаря - Запросы на изменения	 - Отчеты о статусе - Отчеты по отклонениям - Утилизация сотрудников, расчет переработок и простоев	 - Закрытие работ - Проектная мотивация

ИСУП X-Lance 2.0 закрывает потребности всех участников проектной деятельности:

ТОП-МЕНЕДЖЕРА	Контроль всей проектной деятельности в режиме реального времени Оперативное принятие управленческих решений Обеспечение достижения стратегических целей развития и запланированных целевых показателей реализации проектов Обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений
---------------	--

Описание функциональных
характеристик ИСУП X-Lance 2.0


	Экономия – на лицензиях, проекте внедрения, оборудовании и ФОТ (ИСУП X-Lance 2.0 не требует программирования, для настройки достаточно одного аналитика) Внедрение от 2 недель
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА	Сокращаем время на сбор данных и формирование отчетности на 50% Даем оптимальную методологию управления проектами Получаете исчерпывающую информация по статусу выполнения проектов Сводная отчетность по портфелю: прогресс проектов, качество управления, показатели Балансировка ресурсов, анализ загрузки подразделений Актуальная информация о достижении ключевых показателей в ходе реализации проектов Автоматическое построение отчётов на основе реальных данных Контроль за соблюдением и сокращением сроков достижения результатов проекта Снижение затрат на разработку и оформление документации по проекту Обеспечение взаимосвязи данных и логического контроля Повышение эффективности использования ресурсов проектов
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА	Выполнение проектов с соблюдением заданных ограничений Автоматическая отчетность для руководства Получаете единую среду для управления задачами, коммуникациями и хранения документов Используете инструмент эскалации проблем до уровня руководства Автоматизированный сбор статусов от исполнителей Планирование платежей, контроль оплат, анализ БДР и БДДС Выполнение распределения и резервирования ресурсов Контроль коэффициента использования ресурсов
КОМАНДЫ ПРОЕКТА	Учет рабочего времени и тайм шиты Управление расходами по проекту Отслеживание отпусков и праздников Проверка эффективности работы сотрудников Составление бюджета проекта Отслеживание доходов и расходов Автоматизированный отчет о прибылях и убытках и прогноз Отслеживание оплачиваемых часов Выставляйте счета своим клиентам и контролируйте платежи.

2. Ключевые функции ИСУП X-Lance 2.0

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0

Проекты


Полная картина по портфелю проектов. Все проекты компании в одном месте и едином формате. Легко управляйте несколькими проектами в единой среде.

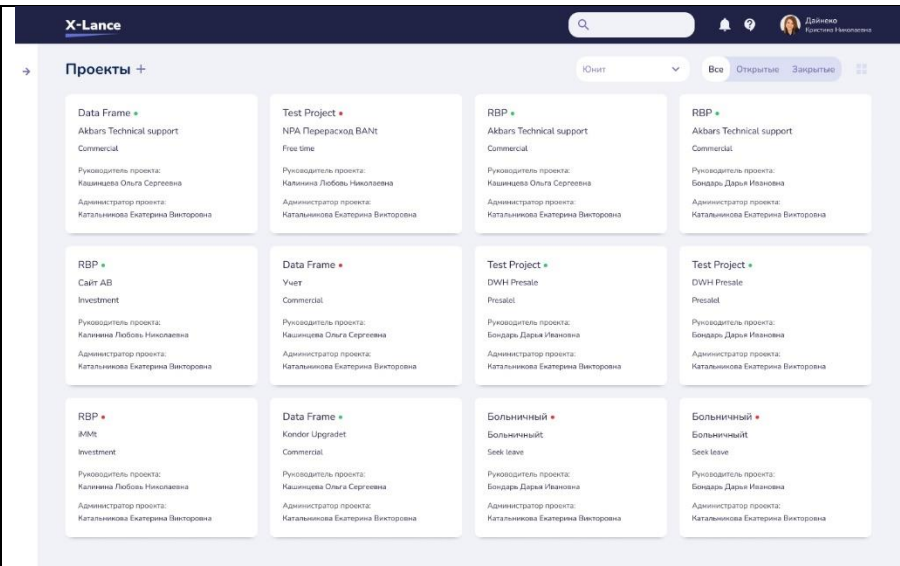

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0

Задачи

Разделяйте работу на легко управляемые части, которыми будете заниматься вы и ваши коллеги.

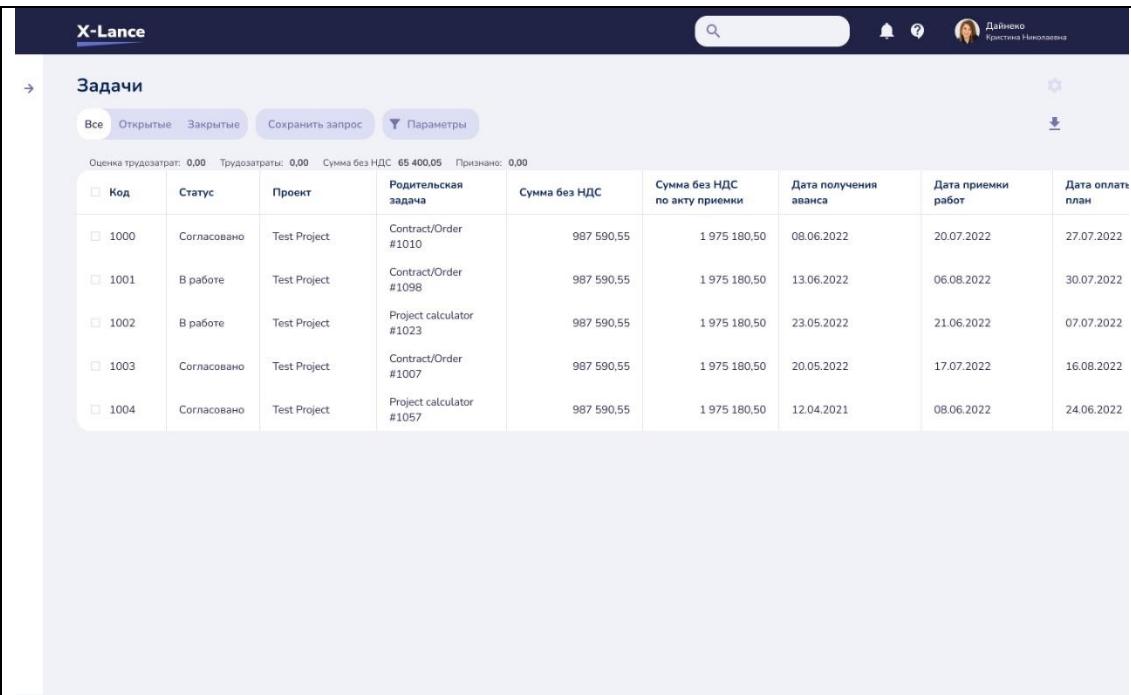

→ Задачи

Все Открытые Закрытые Сохранить запрос Параметры


Оценка трудозатрат: 0,00 Трудозатраты: 0,00 Сумма без НДС: 65 400,05 Признано: 0,00

☐ Код	Статус	Проект	Родительская задача	Сумма без НДС	Сумма без НДС по акту приемки	Дата получения аванса	Дата приемки работ	Дата оплаты план
☐ 1000	Согласовано	Test Project	Contract/Order #1010	987 590,55	1 975 180,50	08.06.2022	20.07.2022	27.07.2022
☐ 1001	В работе	Test Project	Contract/Order #1098	987 590,55	1 975 180,50	13.06.2022	06.08.2022	30.07.2022
☐ 1002	В работе	Test Project	Project calculator #1023	987 590,55	1 975 180,50	23.05.2022	21.06.2022	07.07.2022
☐ 1003	Согласовано	Test Project	Contract/Order #1007	987 590,55	1 975 180,50	20.05.2022	17.07.2022	16.08.2022
☐ 1004	Согласовано	Test Project	Project calculator #1057	987 590,55	1 975 180,50	12.04.2021	08.06.2022	24.06.2022

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0


Доски задач

Представляйте ход работ визуально на цифровых Agile-досках и наблюдайте за тем, как сотрудники выполняют назначенные им задачи.

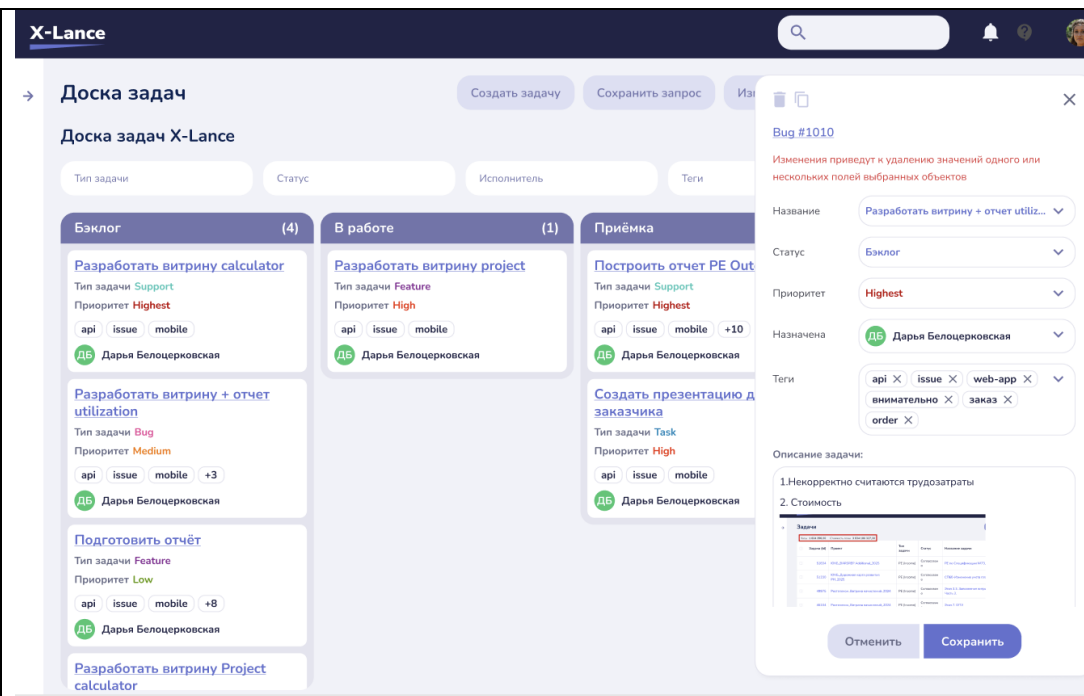

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0

Диаграмма Ганта
Контролируйте объем работ по проекту, график, контрольные точки, зависимости и важные показатели.

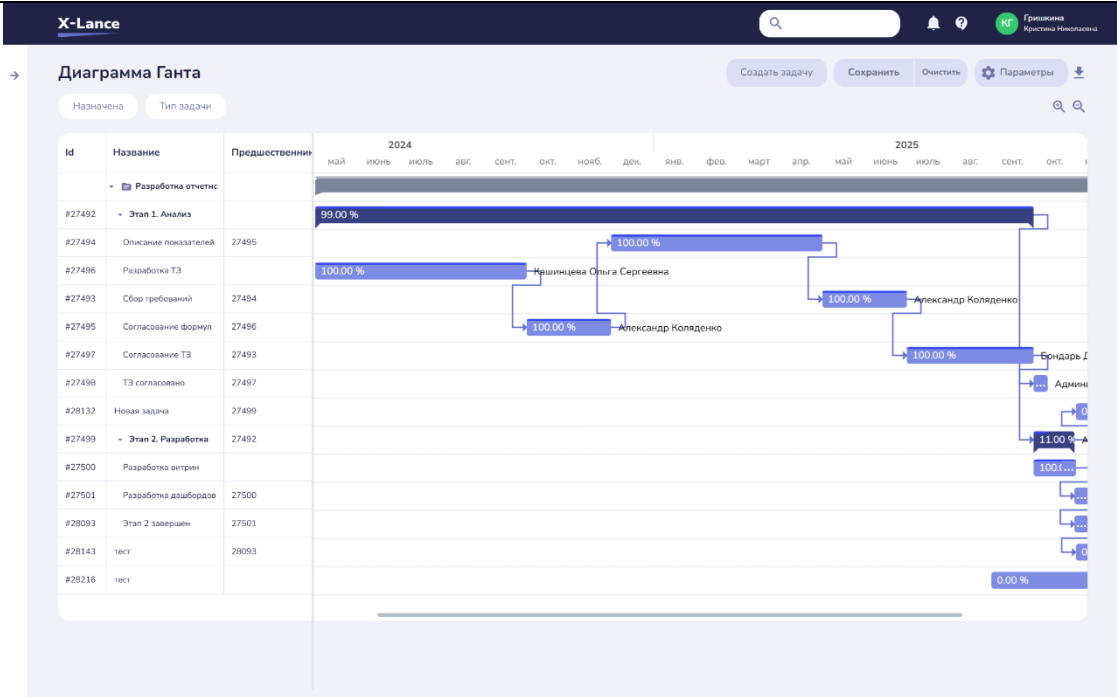

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0

Ресурсный план
Составьте точные сведения о
плановой себестоимости и загрузке
сотрудников.

X-Lance

Гришкина
Кристина Николаевна

Ресурсный план

Проект Ресурс

Дата с октябрь 2025

Дата по декабрь 2025

Сохранить

Очистить

Параметры

Бизнес-юнит

Проект

Договор

Подразделение

Сотрудник

Ресурс	Проект	Задача	Начало	Окончание	Загрузка, %	Окт. 2025 184	Нояб. 2025 160	Дек. 2025 184
Разработчик 2 гре...	Пример проекта	Работа на проекте	19.05.2025	31.12.2025	100,00	184,00	160,00	184,00
Разработчик 2 гре...	Демонстрация Дия...	Разработка дашбо...	23.09.2025	26.01.2026	50,00	92,00	80,00	92,00
+					Итого	276,00	240,00	276,00
					Простой/Перегруз	1 564,00	1 360,00	1 564,00
Кашинцева Ольга ...	Пример проекта	Разработка отчета 2	01.03.2024	22.01.2026	100,00	16,00	0,00	0,00
Кашинцева Ольга ...	Отпуска	тест2	01.01.2025	31.12.2025	4,79	8,81	7,66	8,90
Кашинцева Ольга ...	Разработка отчетн...	тест	15.09.2025	26.11.2025	20,00	36,80	28,80	0,00
Кашинцева Ольга ...	Пресейл проект	Участие в пресейле	01.10.2025	31.10.2025	21,74	40,00	0,00	0,00
Кашинцева Ольга ...	тест	тест	20.10.2025	24.11.2025	48,08	38,46	61,54	0,00
+					Итого	140,07	98,00	8,90
					Простой/Перегруз	43,93	62,00	175,10
Гришкина Кристин...	Пресейл проект	Участие в пресейле	01.10.2025	31.12.2025	56,97	110,40	80,00	110,40
Гришкина Кристин...	Проект для примера	Аналитика	01.08.2025	31.01.2026	50,00	92,00	80,00	92,00
Гришкина Кристин...	Отпуска	тест2	01.01.2025	31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00
+					Итого	202,40	160,00	202,40
					Простой/Перегруз	-18,40	0,00	-18,40

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0

Табель учета рабочего времени

Структурируйте сведения о рабочем времени в удобной форме.


X-Lance 🔍 🔔 👤 Дайнеко Кристина Николаевна

→ **Табель** Основные часы Сверхурочные < 14 марта 2022 — 08 апреля 2022 > Сохранить Очистить

Проект	Задача	14.03 Пн	15.03 Вт	16.03 Ср	17.03 Чт	18.03 Пт	19.03 Сб	20.03 Вс	Итого
Test Project	Contract/Order	2 Комментарий	4 Комментарий	0 Комментарий	3 Комментарий	2 Комментарий	0 Комментарий	0 Комментарий	11
Административный	Planned Cost	4 Комментарий	0 Комментарий	6 Комментарий	2 Комментарий	0 Комментарий	0 Комментарий	0 Комментарий	12
Проект 1	Resource Project Task	2 Комментарий	2 Комментарий	2 Комментарий	2 Комментарий	6 Комментарий	0 Комментарий	0 Комментарий	14
+	Итого	8	6	8	7	8	0	0	37
	Простой/Перегруз	0	2	0	1	0	0	0	3

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0


Отчеты по ресурсам и отклонениям
Анализируйте эффективность использования ресурсов и принимайте соответствующие управленческие решения.

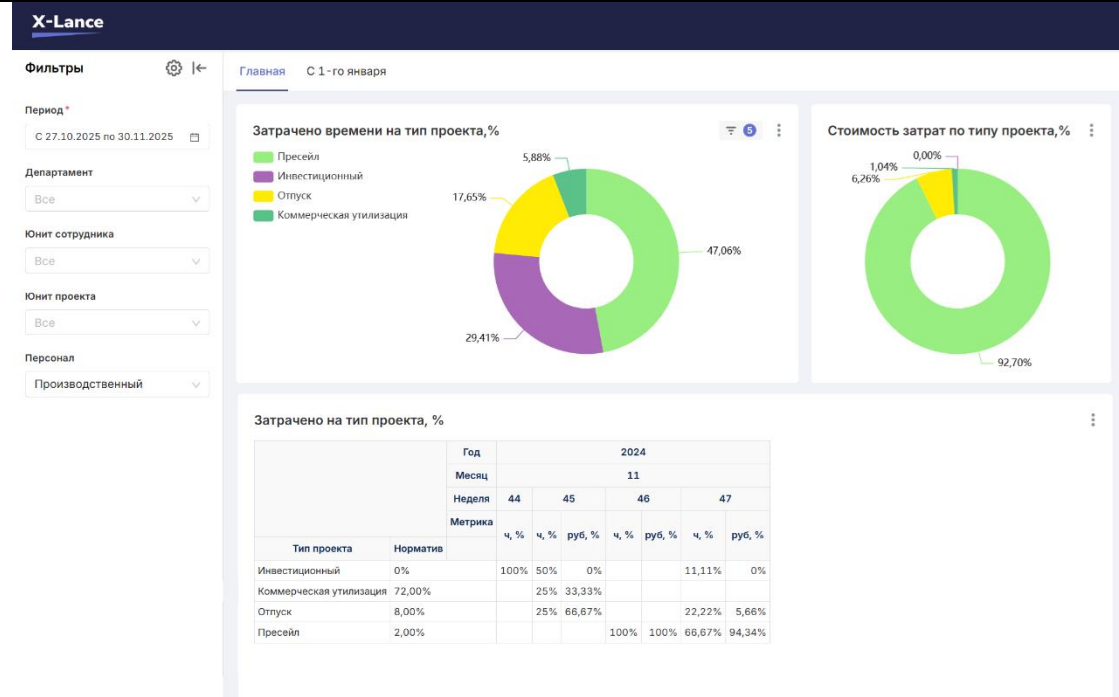

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0


Матрица компетенций

Ведение справочника компетенций сотрудников и возможность обновлять уровень владения компетенциями в личном кабинете сотрудника.

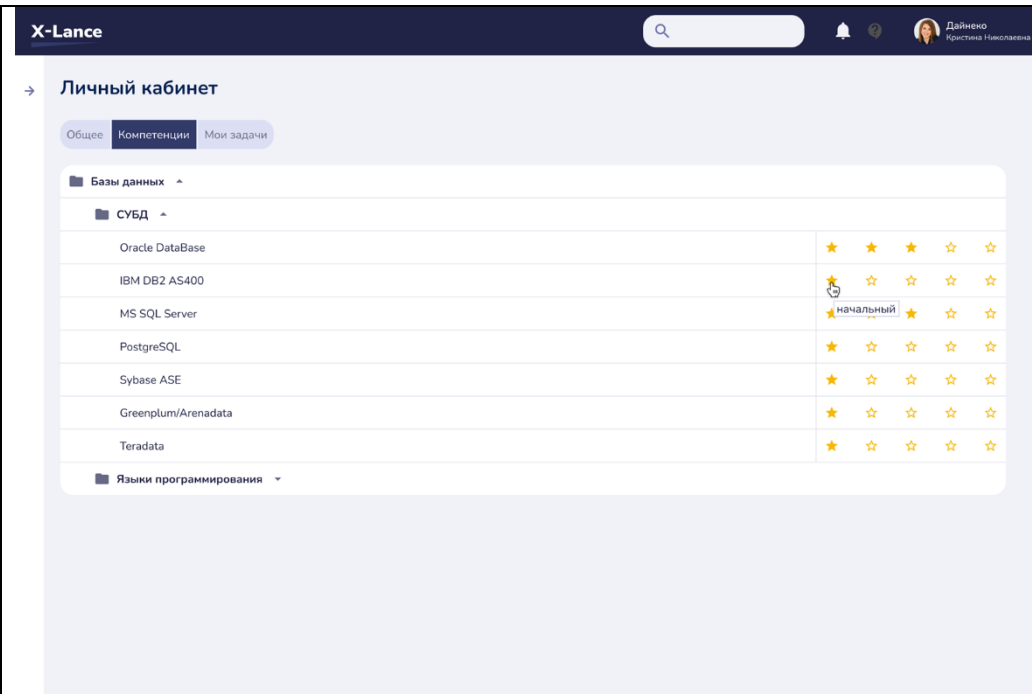

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0

Базовый план проекта
Фиксируется до 12 версий плана —
для точного сравнения и анализа
изменений на любом этапе проекта.

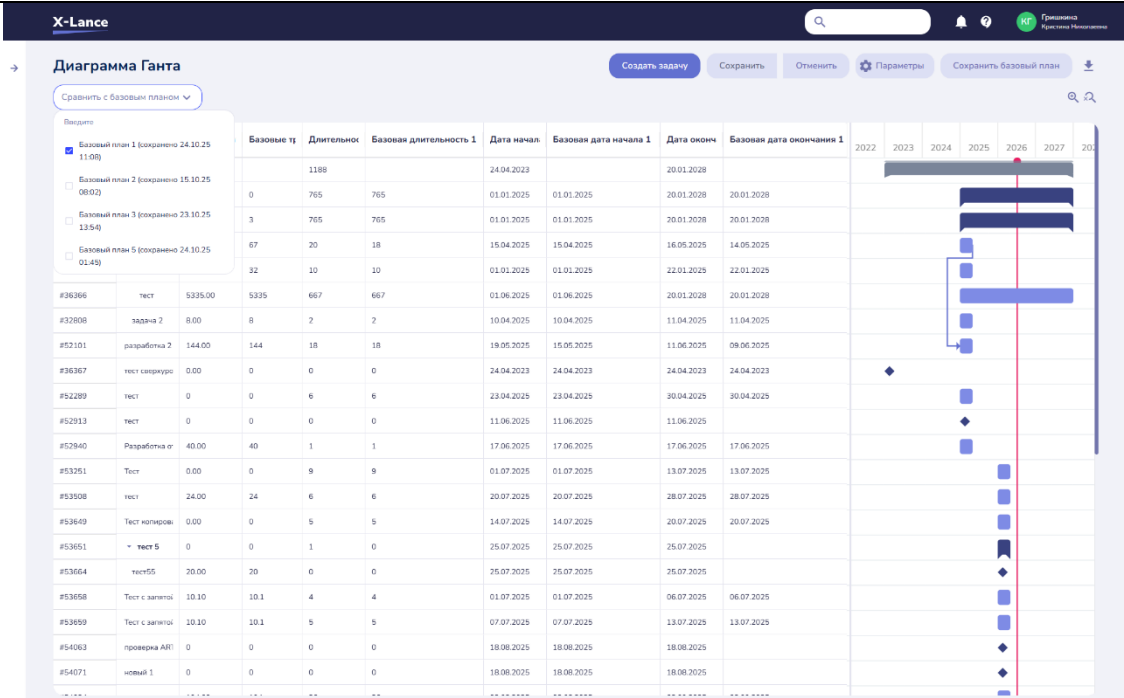

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0

Бюджет проекта

Сводные данные об объеме, сроках и стоимости проекта, согласованные на этапе планирования, на основании которых в процессе выполнения проекта отслеживается его прогресс.

X-Lance

Базовый бюджет проекта

→

☰

Информация по проекту

Заказчик:	Демо Кристина	Тип расчета:	FP
Название проекта:	Демо CRM	Код проекта:	
Название заказа:	Бюджетный план	Код заказа:	28018
Валюта:	RUR	Начало проекта:	11.03.25
Длительность, дн.:	203	Завершение проекта:	30.09.25
Руководитель проекта:	Гришкина К.Н.	Дата составления:	12.03.25

Бюджет проекта

НДС	Целевой доход	Целевая сумма подачи	Сумма по договору	Upsale(+)/ Скидка(-)	Расходы	Целевая маржинальность	Целевая маржинальность на субподряд	Маржинальность по договору	Маржа по договору
Без НДС	14001333.33	14001333.33	10000000	-4001333.33	10501000	25%	0%	-5%	-501000
с НДС	16801600	16801600	12000000	-4801600	12601200	25%	0%	-5%	-601200

Ресурсы

Категория	Внутренняя ставка	Внешняя ставка	Ч/Д	Расходы	Целевые доходы
Итого:	0	0	200	10501000	14001333.33
Прочие расходы	0	0	0	1000	1333.33
Сервисное обслуживание	0	0	0	0	0
Персонал	0	0	200	10500000	14000000
Бизнес-аналитик тестовый	50000	66666.67	50	2500000	3333333.33
Разработчик 2 грейд	60000	80000	56.25	3375000	4500000
Разработчик 2 грейд	60000	80000	68.75	4125000	5500000
Гришкина Кристина Николаевна	20000	26666.67	25	500000	666666.67

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0

Планирование доходов и расходов

В отчете отображается бюджет, факт или сравнение бюджета и факта. Финансовая информация отображается в целом или в разбивке по периодам: месяцам, кварталам или годам. Уникальная возможность отчета — отображение прогнозных значений на основе актуального ресурсного плана. Понимание планового баланса по ходу исполнения проекта позволит вовремя увидеть и исправить проблемы.

X-Lance

Фильтры

Период *
С 01.01.2025 по 31.12.2025

Юнит
Все

Проект
Все

Валюта отчёта *
RUR

С НДС *
Нет

ПРИМЕНИТЬ

ОЧИСТИТЬ

Cashflow

Cashflow

Месяц	ПЛАН	ПРОГНОЗ	ФАКТ	Прогноз на месяц	Отклонение Факта от Плана	Отклонение Прогноза и Факта от Плана
01.2025	243 270 000	240 200 000		240 200 000	-243 270 000	-3 070 000
02.2025	410 000	10 000		10 000	-410 000	-400 000
03.2025						
04.2025	300 000	300 000		300 000	-300 000	0
05.2025	1 045 000	1 045 000		1 045 000	-1 045 000	0
06.2025	3 000 000	3 000 000		3 000 000	-3 000 000	0
07.2025		500 000		500 000		500 000
08.2025			0	0	0	0
09.2025	570 000	2 590 000		2 590 000	-570 000	2 020 000
10.2025	1 000 000	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	0
11.2025		1 700 000		1 700 000		1 700 000
12.2025		0		0		0
ИТОГО	249 595 000	250 345 000	0	250 345 000	-249 595 000	750 000

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0

Стадии сделок и договоров
Контролируйте договорные процессы по проекту.

X-Lance

Гришина
Кристина Викторовна

→ Договор #27544

Добавить трудозатраты

Разработка отчетности

Заказ №1 по договору 233

Добавил(а) Кашинцева Ольга Сергеевна 04.04.2024 18:13 Обновлено 05.09.2025 16:40.

Статус: TO DO

Приоритет: Lowest

Тип расчета: TM

Назначена: Кашинцева Ольга Сергеевна

Трудозатраты факт, ч: 144,00

Дата подписания договора: 06.01.2025

Тег:

Заказчик: Заказчик 1

Сумма без НДС: 100 000,00

Контракт:

Валюта: RUR

Реализация, %: 50

Статус договора:

Клиент: Клиент 1

Наблюдатели +

Бизнес-аналитик тестовый

Стадии договоров

Заказчик	Автор	Стадии договоров	Начало процесса	Комментарии		
Заказчик 1	Кашинцева Ольга Сергеевна	Подготовка ТКП	01.06.2024	начали готовить		
Заказчик 1	Кашинцева Ольга Сергеевна	Согласование заявки на расход	15.07.2024	отправили		
+						

История

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0

Финансы

Отслеживайте даты выставления документов, закрытия актов и оплаты счетов по проекту.

X-Lance

Григорий
Иванов

Сохранить

Отменить

Сохранить запрос

Параметры

Финансы

Проект Открыт/Закрыт

Id	Проект	Название	Договор	Дата подписания договора	Дата приемки, план	Дата аванса, план	Дата передачи акта, план	Дата передачи акта, факт	Дата подписания акта, план	Дата подписания акта, факт	Дата передачи счета, план	Дата передачи счета, факт	Дата оплаты, план	Дата оплаты, факт
#53277	Проверка финансов 1107	тест 1										16.07.2025	13.08.2025	
#53220	Смол тест проект	Смол PE Inc...	Contract/Ord...		01.07.2025	11.07.2025	23.07.2025		29.07.2025		05.07.2025		11.07.2025	
#53219	Смол тест проект	Смол PE Out...			09.07.2025									
#53216	Смол тест проект	Смол PE Out...												
#53215	Смол тест проект	Смол PE Inc...	Contract/Ord...		01.07.2025	07.07.2025	01.07.2025		07.07.2025		26.06.2025		07.07.2025	
#53213	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025					10.07.2025			16.07.2025	
#53210	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025					10.07.2025			16.07.2025	
#53206	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025					10.07.2025			16.07.2025	
#53203	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025					10.07.2025			16.07.2025	
#53190	Демо	тест 3												
#53189	Демо	тест 2												
#53188	Демо	тест 1												
#53186	Проверка финансов 1107	тест												
#53185	Проверка финансов 1107	тест	Contract/Ord...	17.07.2025	10.07.2025					10.07.2025			16.07.2025	

1 2 3 4 ... Следующая →

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0

Согласование изменений
Сделайте согласование изменений
простым и прозрачным.

X-Lance

Григорий Григорьевич

→

Согласование изменений #103

Отменить

Проект

Статус

Создано

Дата создания

Обновил(а)

Обновлено

Тип документа

Документ

Отчет

Принер проекта

На согласовании

Кашинцева Ольга Сергеевна

27.01.2025 13:37

Кашинцева Ольга Сергеевна

27.01.2025 13:37

Исходящий платеж

Исходящий платеж #27696: Командировочные расходы

Исходящий платеж #27884: Работы ООО Ромашка


Название	Значение до	Значение после
Исходящий платеж #27696: Командировочные расходы		
Родительская задача	Договор #27684: Договор №1	Договор #27684: Договор №1
Сумма без НДС	70 000.00	800 000.00
Дата приёма, план	01.08.2024	01.08.2024
Дата оплаты, план	01.08.2024	01.08.2024
Исходящий платеж #27884: Работы ООО Ромашка		
Родительская задача	Договор #27684: Договор №1	Договор #27684: Договор №1
Сумма без НДС	400 000.00	80 000 000.00
Дата приёма, план	28.11.2024	28.11.2024
Дата оплаты, план	04.12.2024	04.12.2024

Результат согласования

Согласующий	Результат	Комментарий
Кашинцева Ольга Сергеевна		

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0


Отчет по отклонениям
Сводные данные по проектному портфелю с указанием отклонений и причин отклонений.

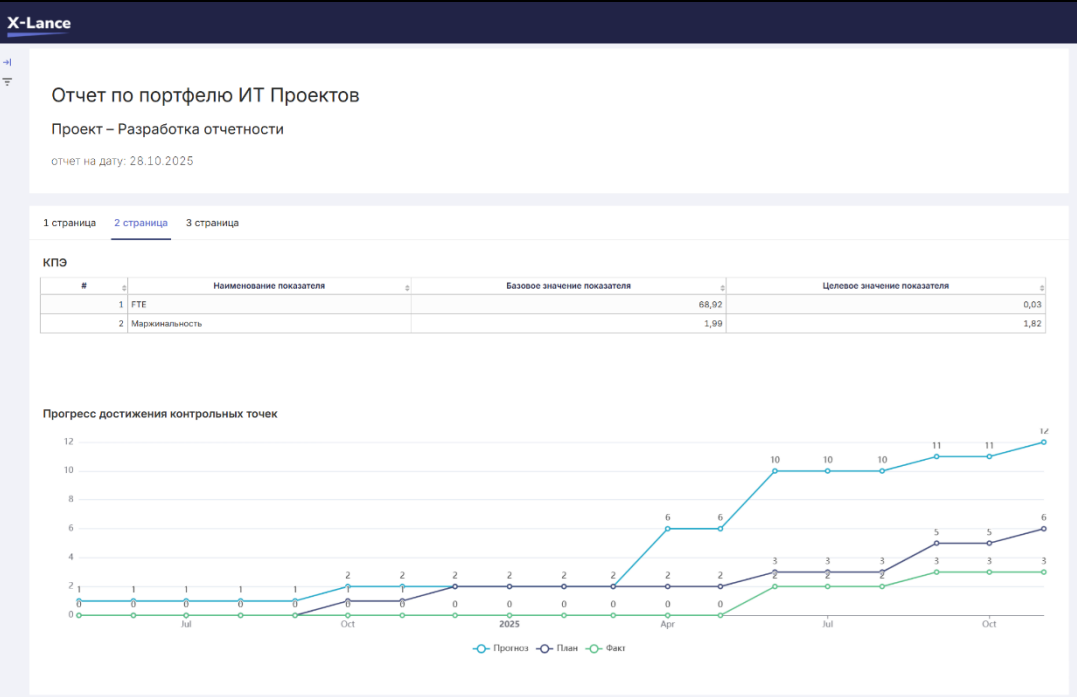

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0

AI помощник

Улучшение пользовательского опыта взаимодействия с основными элементами системы: проектами, задачами, трудозатратами.

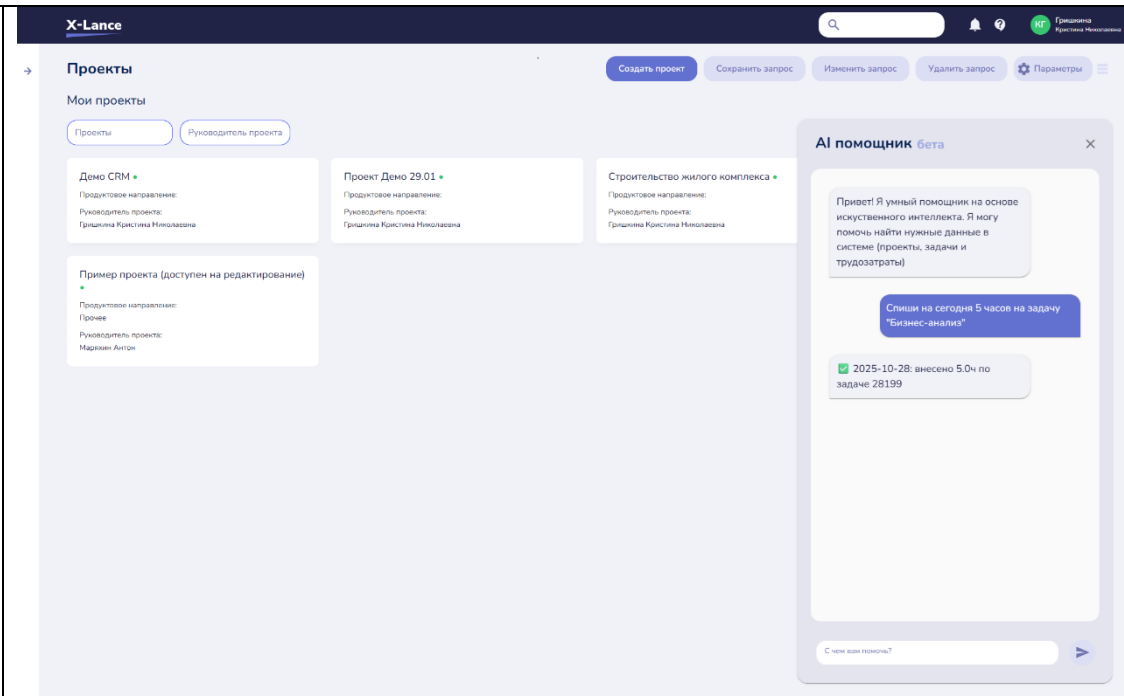

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0

База знаний по проектам
Используйте накопленный опыт по проектам

X-Lance

🔍🔔👤☰

🏠 / Документация / Документация / Пользовательская документация

Пользовательская документация

Редактировал(а) [Ольга Кашинцева](#) 09.12.2024

✎ Редактировать

➕ Создать

⋮

Инструкции по работе в ИСУП X-Lance — это страница, содержащая руководства и инструкции по работе с различными разделами ИСУП X-Lance. Здесь вы найдете подробные описания действий, необходимые для использования системы.

Инструкции по работе с XWiki — это страница, содержащая инструкции по работе с XWiki. Здесь вы найдете подробные описания действий, которые возможны в данной системе.

♥ 0

Теги: [+]

Создал(а) [Полина Герасимова](#) 04.10.2024

Комментарии (0)

Вложения (0)

История

Информация

Пока нет комментариев для этой страницы

💬 Комментировать

Предупреждение о конфиденциальности:

Данный документ содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть раскрыта, распространена и (или) воспроизведена без предварительного письменного разрешения.

стр. 21 из 26

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0

Мультивалютный учет
Бюджетные курсы
Автоматический расчет по курсам ЦБ
Курсовые разницы

X-Lance

Настройки

Фильтры

Валюта

Все

BYN

CNY

EUR

KZT

SEK

USD

UZS

RUR

Перевод на дату

С 30.10.2025 по 30.10.2025

ПРИМЕНИТЬ

ОЧИСТИТЬ

Бюджетные курсы


Валюта	Номинал	Значение	Дата с
BYN	1	28,9773	01.01.2020
CNY	1	14	01.01.2025
EUR	1	88,1291	01.01.2020
EUR	1	65	01.01.2023
EUR	1	102	01.09.2023
EUR	1	111	01.01.2025
KZT	100	19,565	01.09.2023
KZT	100	21	01.01.2025
SEK	10	86,8606	01.01.2020
SEK	1	5,9	01.01.2023
SEK	1	8,5714	01.09.2023
SEK	1	9,8	01.01.2025
USD	1	73,8234	01.01.2020
USD	1	65	01.01.2023
USD	1	90	01.09.2023
USD	1	100	01.01.2025
UZS	10 000	74,6	01.09.2023
UZS	10 000	73,7245	01.04.2024
UZS	10 000	79	01.01.2025

Перевод по курсу на дату

Исходная сумма	Перевод из	Перевод в	Перевод на дату	Курс	Сумма по курсу	Вариант
1	USD	RUR	30.10.2025	79,4715	79,4715	по курсу ЦБ
1	USD	RUR	30.10.2025	100	100	по бюджетному курсу

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0


BI-отчетность
 Конструктор дашбордов
 Совместимость с любой BI-системой

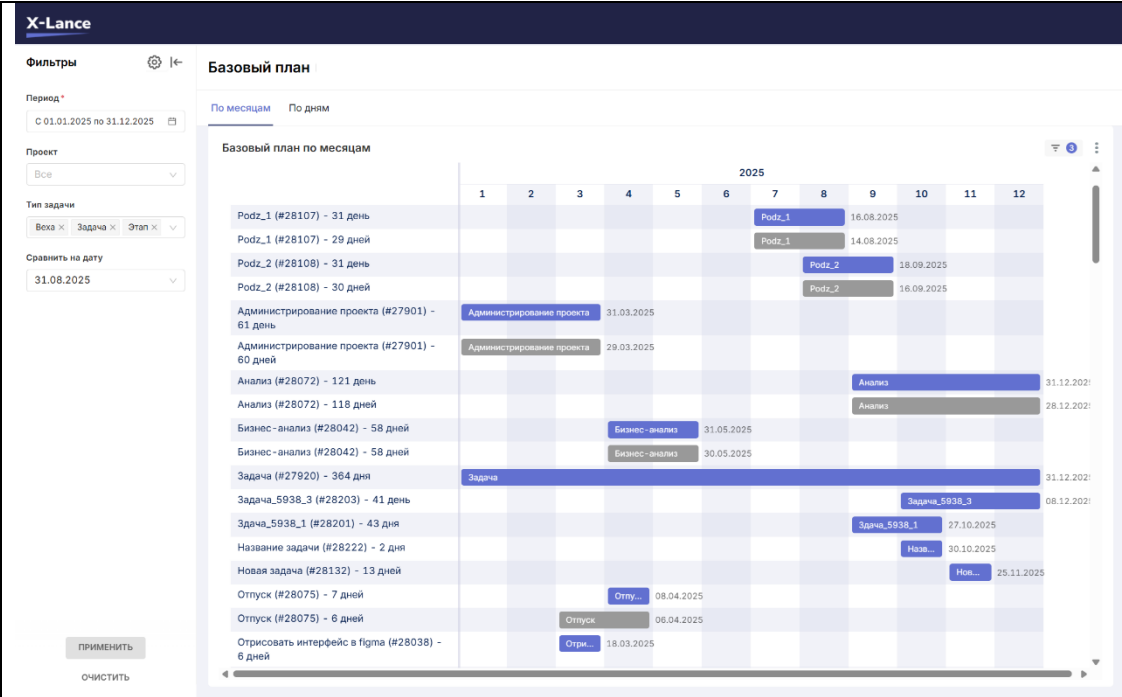

Описание функциональных характеристик ИСУП X-Lance 2.0


Мобильное приложение

Отслеживайте данные в мобильном
приложении

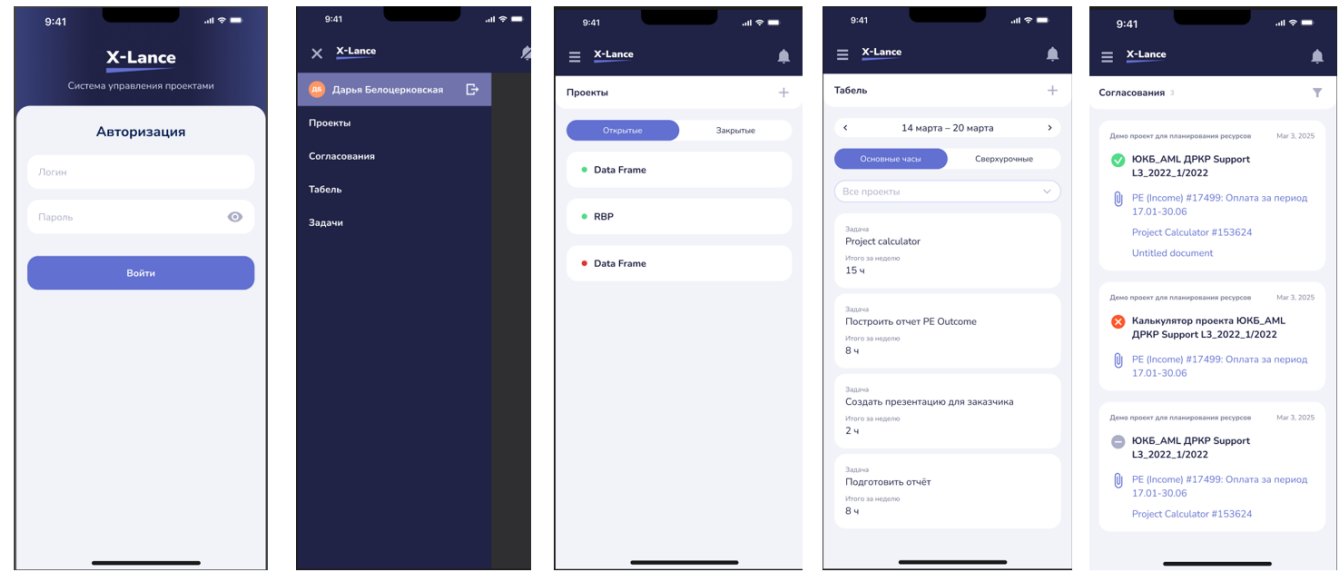

3. Структура данных системы


Система поддерживает следующую структуру данных, которая настраивается в разделе Модули- Issues Rules plugin, где определяются отношения между дочерними и родительскими объектами.

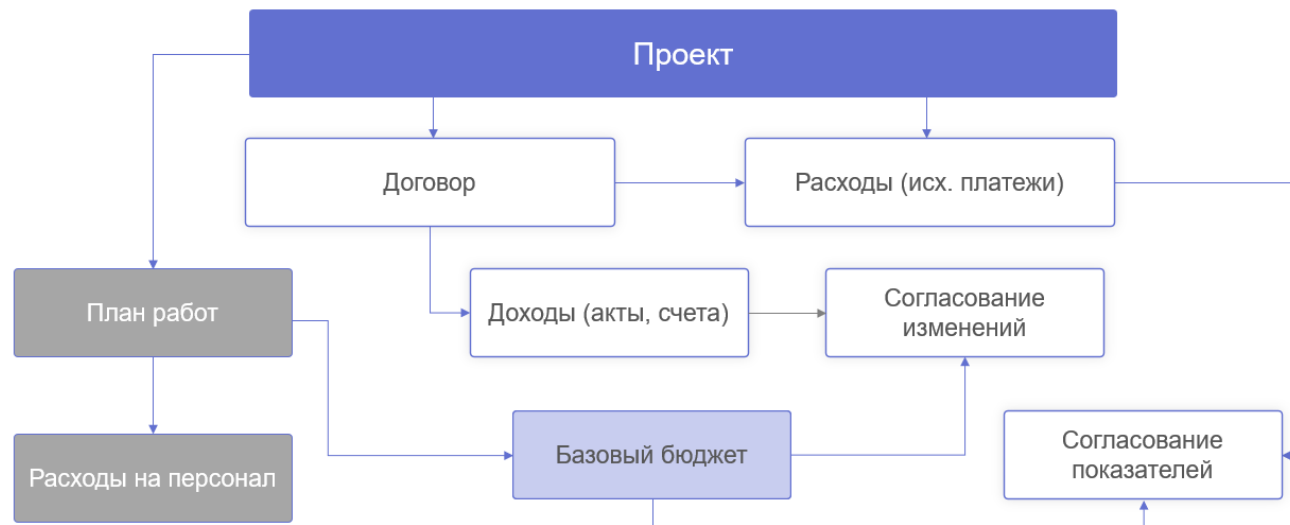

4. Настройка системы

Гибкая настройка системы позволяет определить ролевую модель на уровне доступа к проектам, трекерам, полям объектов и последовательности действий по трекерам.

Описание функциональных характеристик
ИСУП X-Lance 2.0

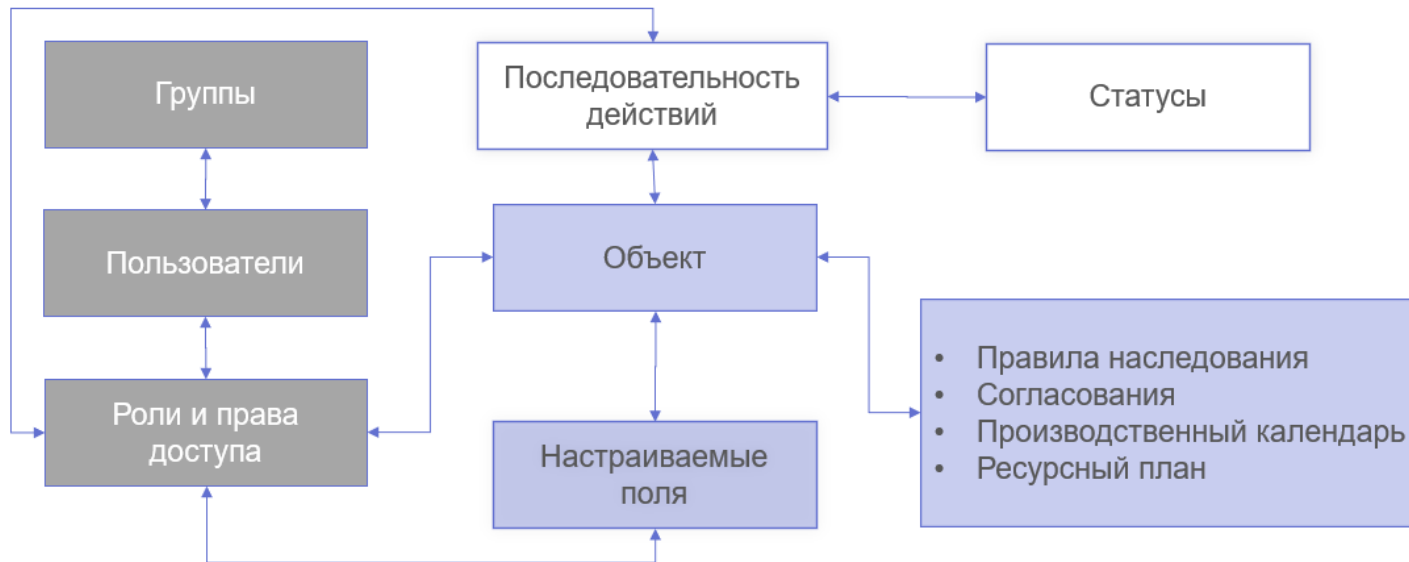

5. Поставка системы

Система в зависимости от типа приобретенной лицензии может поставляться заказчику следующими способами:

- Система как сервис (SAAS), в виде облачного решения с удаленным доступом через интернет к серверам правообладателя.
- В виде инсталляционных файлов для установки на серверах заказчика с доступом по локальной сети либо через интернет к серверам заказчика.
